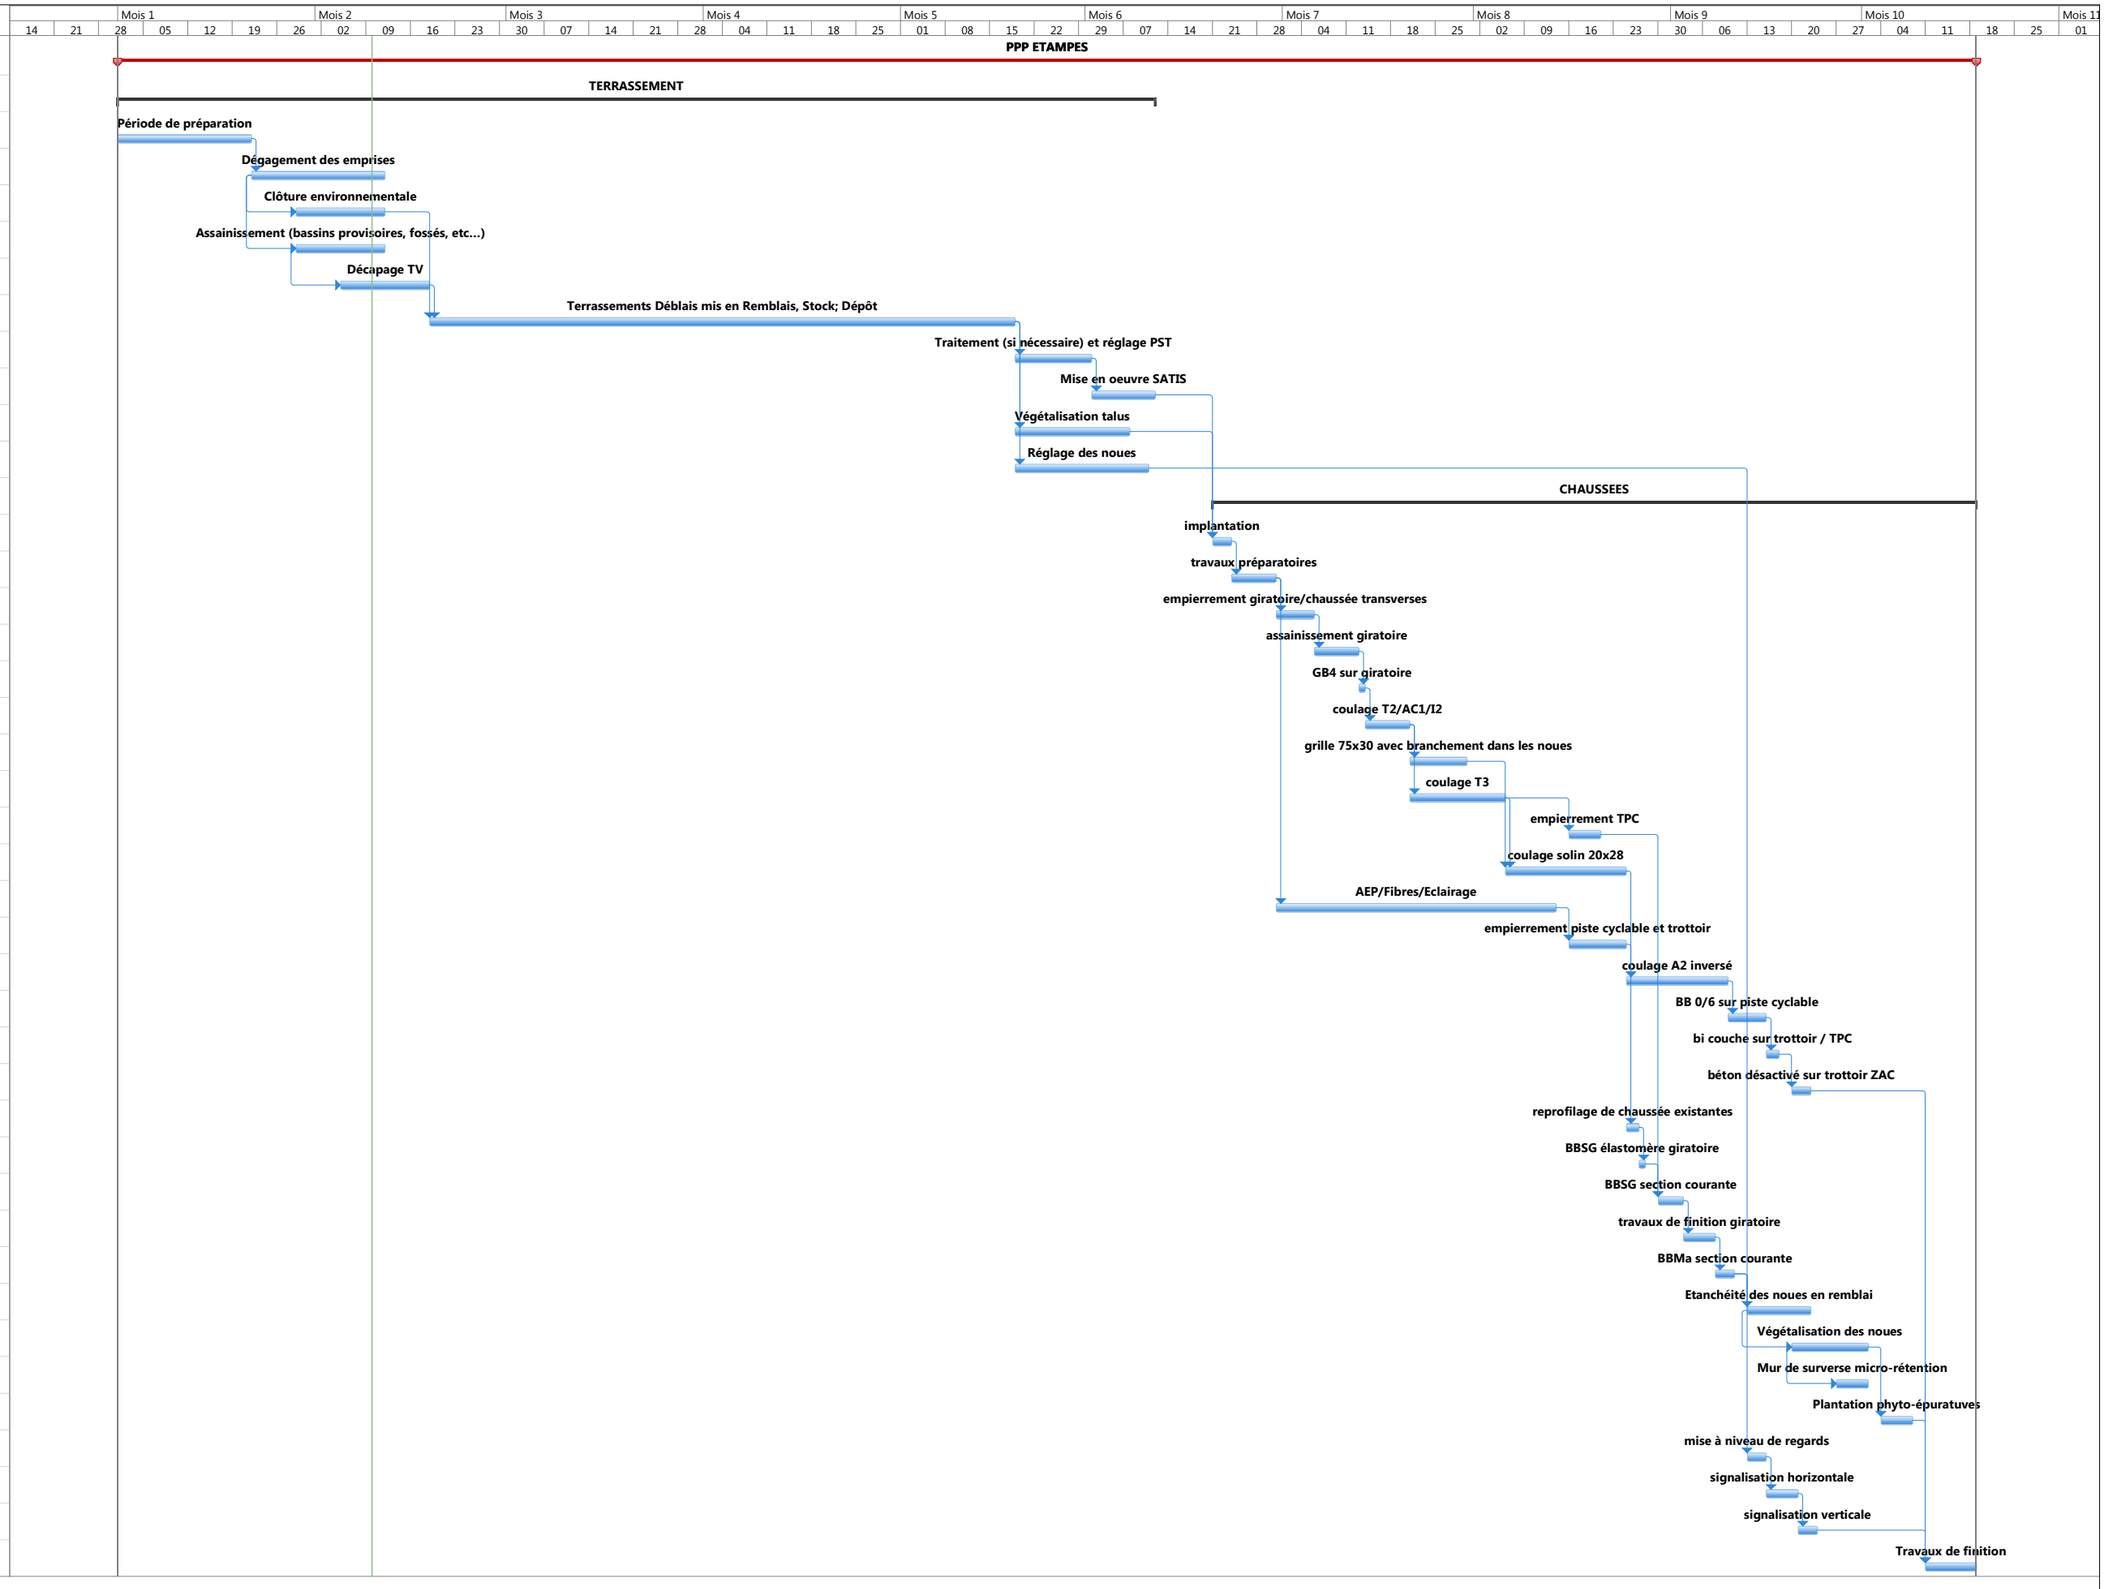N°	Nom de la tâche	Durée
0	**PPP ETAMPES**	**208 jours**
1	**TERRASSEMENT**	**117 jours**
2	Période de préparation	15 jours
3	Dégagement des emprises	3 sm
4	Clôture environnementale	2 sm
5	Assainissement (bassins provisoires, fossés, etc...)	2 sm
6	Décapage TV	10 jours
7	Terrassements Déblais mis en Remblais, Stock; Dépôt	66 jours
8	Traitement (si nécessaire) et réglage PST	8 jours
9	Mise en oeuvre SATIS	8 jours
10	Végétalisation talus	12 jours
11	Réglage des noues	15 jours
12	**CHAUSSEES**	**86 jours**
13	implantation	3 jours
14	travaux préparatoires	5 jours
15	empierrement giratoire/chaussée transverses	4 jours
16	assainissement giratoire	5 jours
17	GB4 sur giratoire	1 jour
18	coulage T2/AC1/I2	5 jours
19	grille 75x30 avec branchement dans les noues	7 jours
20	coulage T3	11 jours
21	empierrement TPC	5 jours
22	coulage solin 20x28	13 jours
23	AEP/Fibres/Eclairage	32 jours
24	empierrement piste cyclable et trottoir	7 jours
25	coulage A2 inversé	12 jours
26	BB 0/6 sur piste cyclable	4 jours
27	bi couche sur trottoir / TPC	2 jours
28	béton désactivé sur trottoir ZAC	3 jours
29	reprofilage de chaussée existantes	2 jours
30	BBSG élastomère giratoire	1 jour
31	BBSG section courante	4 jours
32	travaux de finition giratoire	3 jours
33	BBMa section courante	3 jours
34	Etanchéité des noues en remblai	8 jours
35	Végétalisation des noues	10 jours
36	Mur de surverse micro-rétention	1 sm
37	Plantation phyto-épuratuves	1 sm
38	mise à niveau de regards	3 jours
39	signalisation horizontale	3 jours
40	signalisation verticale	3 jours
41	Travaux de finition	6 jours
